



***Raport z monitoringu dokumentu
pn. „Gminny Program Rewitalizacji
Gminy Dębica na lata 2016–2024”***



INICJATYWAŁOKALNA.PL
SP. Z O.O.

Wrzesień 2020

Spis treści

Wstęp.....	3
1. Metodologia monitorowania założeń programu	4
2. Sprawozdanie z monitoringu rzeczowego	11
2.1. Analiza osiągniętych wskaźników w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działania.....	11
2.2. Analiza osiągniętych wskaźników w odniesieniu do projektów podstawowych i przedsięwzięć uzupełniających	21
3. Sprawozdanie z monitoringu finansowego	26
3.1. Analiza wykonania finansowego projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych	26
Podsumowanie	37
Spis tabel	38
Spis wykresów.....	38

Wstęp

Kluczowe znaczenie dla prawidłowej i efektywnej realizacji założeń *Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024* ma system jego monitoringu skuteczności działań, oceny oraz wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu dokumentu. Podstawą oceny aktualności i stopnia realizacji dokumentu są wyniki procesu monitorowania postępu jego wdrażania w oparciu o art. 22 ust. 1 *Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji* (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn. zm.) oraz na zasadach określonych w ww. programie, w części IV. wdrożeniowej, w rozdziale 2. *System monitoringu, oceny i wprowadzania zmian do programu*.

Zadaniem monitorowania jest sprawdzanie postępu i skuteczności wdrażanych działań oraz realizowanych projektów dla celów kontroli zarządzania i podejmowania decyzji. Kierując się efektywnością wykorzystania dostępnych środków finansowych oraz innych zasobów, niezbędne jest prowadzenie analizy oddziaływania realizowanych przedsięwzięć na rozwiązywanie konkretnych problemów obszaru rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i środowiskowej. Wskazane działania prowadzą do większej przejrzystości i kontroli zadań realizowanych przez administrację publiczną. Informowanie społeczności lokalnej o przebiegu procesu rewitalizacji i wynikach monitorowania ma na celu wzmocnienie poczucia partnerstwa i odpowiedzialności oraz aktywizowania interesariuszy rewitalizacji. Takie podejście zakłada również zwiększenie roli społeczności lokalnych nie tylko w trakcie planowania i tworzenia dokumentów strategicznych, ale również wdrażania tych zapisów, by skupiać się na rezultatach i wynikach oraz na ocenie szerszego kontekstu oddziaływania programu.

Niniejszy raport z monitoringu dotyczy okresu sprawozdawczego obejmującego lata 2016–2019. Opracowany został na zlecenie Urzędu Gminy w Dębicy przy współudziale zarówno Wydziału Inwestycji UG w Dębicy we współpracy z innymi wydziałami Urzędu, jak również specjalistów i ekspertów zewnętrznych. Jest to dokument wykorzystujący analizę danych zastanych, przygotowanych w oparciu o proces systematycznego zbierania oraz analizowania ilościowych i jakościowych danych na temat wdrażanych projektów w aspektach finansowym i rzeczowym, oraz wskaźników w odniesieniu do zakładanych rezultatów końcowych. Stały monitoring ma za zadanie zbadać zgodność z harmonogramem, zakładanym budżetem oraz zmienność warunków zewnętrznych. Pozwoli również na poznanie problemów i trudności, jakie napotkać może wdrażanie następnych działań na obszarze rewitalizacji w kolejnych latach.

1. Metodologia monitorowania założeń programu

Zgodnie z zapisami części IV. wdrożeniowej, rozdziału 2., podrozdziału 2.1. *Sposoby monitorowania i sprawozdawczości* „wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji będzie się odbywało w oparciu o monitoring zmierzający do oceny stopnia realizacji celów rewitalizacji, a także zaplanowanych projektów i/lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych (...) Monitorowanie obejmować będzie zarówno rzeczowe jak i finansowe aspekty wdrażania dokumentu”¹.

Dane na temat aktualnego stanu realizacji GPR zmierzone będą za pomocą wskaźników produktu i rezultatu, przyporządkowanych do konkretnych projektów i/lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jak i wskaźników oddziaływania w odniesieniu do celów rewitalizacji, które wykorzystane zostały na etapie diagnostycznym gminy do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji. Wskaźniki produktu i rezultatu umożliwią ocenę postępu i efektywności jego głównych założeń, natomiast wskaźniki oddziaływania posłużą do przedstawienia skali i charakteru zmian w aktualnej sytuacji czy tendencji zachodzących na obszarze rewitalizacji w porównaniu do terenu całej gminy. Wskaźniki monitoringowe wdrażania programu przedstawione zostały w tabeli 1.

Jednym z elementów oceny postępów wdrażania założeń programu będzie również monitoring finansowy, który dostarczy danych na temat szacunkowego kosztu oraz wykorzystanych źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków. Dane obejmować będą m.in. wysokość wkładu własnego i pozyskanych środków zewnętrznych, wydatki poniesione w okresie objętym badaniem oraz od początku realizacji projektu, procentowy stan zaawansowania realizacji interwencji, stopień osiągnięcia założonych wskaźników, a także informacje na temat postępu wykonania przyjętego harmonogramu w oparciu o ustalony plan finansowy.

Monitorowaniem, mającym na celu zapewnienie zgodności realizacji postanowień z wcześniej zatwierdzonymi założeniami, zajmuje się Wydział Inwestycji UG w Dębicy we współpracy z innymi wydziałami Urzędu. Zgodnie z zapisami podrozdziału 2.1 programu, jego zadania to przede wszystkim „systematyczne zbieranie oraz analizowanie ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów, a także założonych celów dokumentu na podstawie danych gromadzonych i przekazywanych przez poszczególne samodzielne stanowiska pracy/referaty (aktualnie wydziały) UG Dębica, jednostki

¹ *Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024* (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/443/2017 Rady Gminy Dębica z dnia 7 grudnia 2017 r.), s. 148.

organizacyjne gminy oraz inne instytucje zewnętrzne i podmioty realizujące projekty na obszarze rewitalizacji i/lub będące partnerami w realizacji określonych działań”².

Wydział Infrastruktury Technicznej Inwestycji i Remontów UG Dębica (obecnie Wydział Inwestycji) jako podmiot odpowiedzialny za zarządzanie procesem rewitalizacji w gminie ma również następujące zadania³:

- 1) gromadzenie i analizowanie informacji w układzie określonego dla celów i projektów zestawu wskaźników;
- 2) sporządzanie co 2 lata raportu/sprawozdania z postępu w realizacji dokumentu i przedstawianie go do zaopiniowania przez Komitet Rewitalizacji, a następnie po pozytywnym zaopiniowaniu do zatwierdzenia przez Radę Gminy Dębica. Raport będzie zawierał informacje na temat wartości mierzonych corocznie wskaźników monitoringowych (produktu, rezultatu) i wartości wskaźników oddziaływania, mierzonych co 2 lata.
- 3) udostępnianie lokalnej społeczności wyników sprawozdawczości poprzez ich publikowanie na stronie internetowej gminy (ugdebica.pl, w zakładce „Rewitalizacja Gminy Dębica”), w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.ugdebica.pl), a także przekazywanie informacji wszystkim zainteresowanym podmiotom podczas spotkań z interesariuszami rewitalizacji.

Rada Gminy Dębica analizować będzie postępy w realizacji głównych założeń Gminnego Programu Rewitalizacji poprzez m.in. akceptację raportu/sprawozdania z postępu we wdrożeniu zapisów.

Kierując się zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji w II–III kwartale 2020 roku przeprowadzono prace w zakresie pozyskania danych statystycznych za okres 2016–2019, będących podstawą monitorowania i analizy wskaźników oddziaływania. Analiza wykonana została w odniesieniu do następujących głównych celów programu:

- Cel rewitalizacji 1. *Zwiększenie tożsamości lokalnej oraz rozwój przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców;*
- Cel rewitalizacji 2. *Poprawa warunków życia mieszkańców.*

² Gminny Program Rewitalizacji..., s. 148–149.

³ jw., s. 148–149.

W opracowaniu wykorzystane zostały dane statystyczne udostępnione przez Urząd Gminy Dębica oraz instytucje zewnętrzne – Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy. W tabeli 2 przeanalizowano 11 wskaźników obrazujących stan obszaru rewitalizacji od pierwszego roku obowiązywania programu, czyli 2016 roku, do końca pierwszego okresu sprawozdawczego, czyli 2019 roku.

Tabela 1 Wskaźniki monitoringowe wdrażania programu

Założenia GPR	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Źródło danych	Wartość bazowa dla obszaru rewitalizacji (stan na 31.12.2014 r.)	Średnia wartość dla gminy (stan na 31.12.2014 r.)	Wartość docelowa (stan na 31.12.2024 r.)
WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA						
Cel rewitalizacji 1. Zwiększenie tożsamości lokalnej oraz rozwój przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców	Udział % ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do ludności ogółem	%	Urząd Gminy Dębica	16,1	21,8	20,0
	Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	-	Urząd Gminy Dębica	0,44	0,41	0,5
	Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	-	Urząd Gminy Dębica	-1,4	0,3	0,1
	Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania	%	Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy	9,8	9,2	8,0
	Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	osoby	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy	8,2	7,2	7,0
	Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	osoby	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy	1,9	1,8	1,5
	Frekwencja w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (I tura)	%	Urząd Gminy Dębica	39,2	47,7	49,0
	Liczb zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	szt.	Urząd Gminy Dębica	2,2	2,9	3,0

	Liczb nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	szt.	Urząd Gminy Dębica	0,35	0,36	0,40
Cel rewitalizacji 2. Poprawa warunków życia mieszkańców	Powierzchnia terenów zagospodarowanych pod działalność sportową, rekreacyjną, kulturową i turystyczną przypadająca na 100 mieszkańców	ha	Urząd Gminy Dębica	0,6	0,3	0,8
	Budynki mieszkalne nowo oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców	szt.	Urząd Gminy Dębica	4,4	35,5	7,0
Projekty/Przedsięwzięcia rewitalizacyjne	WSKAŹNIKI PRODUKTU					
	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	ha	Beneficjenci projektów	0		8,7
	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	szt.	Beneficjenci projektów	0		70
	Liczba zorganizowanych szkoleń/warsztatów/zajęć/spotkań	szt.	Beneficjenci projektów	0		12
	Liczba zmodernizowanych elektrycznie budynków	szt.	Beneficjenci projektów	0		3
	Liczba wybudowanych urządzeń/obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	szt.	Beneficjenci projektów	0		3
	Długość przebudowanych dróg powiatowych	km	Beneficjenci projektów	0		1,3
	Długość wybudowanych chodników/ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych	km	Beneficjenci projektów	0		1,3
	Liczba osób objętych wsparciem	osoby	Beneficjenci projektów	0		500
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoby	Beneficjenci projektów	0		40
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	osoby	Beneficjenci projektów	0		60

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoby	Beneficjenci projektów	0	6
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie	osoby	Beneficjenci projektów	0	40
WSKAŹNIKI REZULTATU				
Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu	osoby	Beneficjenci projektów	0	90
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	szt.	Beneficjenci projektów	0	3
Ilość utworzonych grup wsparcia	szt.	Beneficjenci projektów	0	3
Liczba osób korzystających rocznie z powstałej infrastruktury rekreacyjnej/sportowej/turystycznej	osoby	Beneficjenci projektów	0	1 500
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej	GJ/rok	Beneficjenci projektów	0	0,4
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWh/rok	Beneficjenci projektów	0	400
Liczba nowych usług sportowo-rekreacyjnych	szt.	Beneficjenci projektów	0	3
Średni czas przejazdu między dwoma punktami (początkiem i końcem odcinka drogi)	minuty	Beneficjenci projektów	0	Wartość zostanie określona na podstawie dokumentacji przed realizacją projektu
Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (liczba odbiorców działań)	osoby	Beneficjenci projektów	0	400
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu	osoby	Beneficjenci projektów	0	15

	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	Beneficjenci projektów	0	30
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie	osoby	Beneficjenci projektów	0	5
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących po opuszczeniu programu	osoby	Beneficjenci projektów	0	40
	Wzrost aktywności społecznej i tożsamości lokalnej mieszkańców (liczba uczestników spotkań/imprez)	osoby	Beneficjenci projektów	0	500
	Liczba zdegradowanych budynków zaadaptowanych do celów publicznych	szt.	Beneficjenci projektów	0	1

Źródło: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024, s. 151–154

2. Sprawozdanie z monitoringu rzeczowego

2.1. Analiza osiągniętych wskaźników w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działania

Monitoring rzeczowy umożliwił ocenę postępu oraz efektywności głównych założeń Gminnego Programu Rewitalizacji w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań. Rzeczowe aspekty wdrażania dokumentu zmierzone zostały m.in. za pomocą wskaźników oddziaływania w odniesieniu do celów rewitalizacji, które wykorzystane zostały na etapie diagnostycznym gminy. W związku z tym posłużyły do przedstawienia skali i charakteru zmian w aktualnej sytuacji czy tendencji zachodzących na obszarze rewitalizacji w porównaniu do terenu całej gminy (tabela 2). Punktem odniesienia w procesie weryfikacji były dane bazowe dostępne na etapie opracowania diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, czyli według stanu na koniec 2014 roku.

Tabela 2 Wskaźniki oddziaływania w poszczególnych latach obowiązywania programu (wg stanu na dzień 31.12)


Założenia GPR	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Źródło danych	WARTOŚCI BAZOWE		WARTOŚĆ DOCELOWA dla obszaru rewitalizacji (stan na 31.12.2024 r.)	WSKAŹNIKI W LATACH MONITOROWANIA							
				2014			2016		2017		2018		2019	
				Wartość dla obszaru rewitalizacji	Wartość dla gminy		Wartość dla obszaru rewitalizacji	Wartość dla gminy	Wartość dla obszaru rewitalizacji	Wartość dla gminy	Wartość dla obszaru rewitalizacji	Wartość dla gminy	Wartość dla obszaru rewitalizacji	Wartość dla gminy
Cel 1. Zwiększenie tożsamości lokalnej oraz rozwój przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców	Udział % ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do ludności ogółem	%	Urząd Gminy Dębica	16,1	21,8	20,0	15,9	21,0	15,9	20,8	15,9	20,7	16,1	20,6
	Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	-	Urząd Gminy Dębica	0,44	0,41	0,5	-0,13	-0,27	0,00	-0,46	-0,27	-0,23	-0,18	-0,30
	Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	-	Urząd Gminy Dębica	-1,4	0,3	0,1	1,2	0,2	1,9	0,5	1,1	0,1	1,0	0,3
	Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania	%	Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy	9,8	9,2	8,0	6,6	6,9	6,9	5,1	4,3	4,3	3,0	3,5
	Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	osoby	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy	8,2	7,2	7,0	2,5	2,6	2,3	2,4	2,4	2,1	2,5	2,1
	Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	osoby	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy	1,9	1,8	1,5	0,9	0,7	0,7	0,6	0,7	0,5	0,7	0,4
	Frekwencja w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (I tura)	%	Urząd Gminy Dębica	39,2	47,7	49,0	-	-	-	-	41,8	42,8	-	-
	Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	szt.	Urząd Gminy Dębica	2,2	2,9	3,0	5,7	6,3	5,6	6,3	5,6	6,6	5,5	6,9
	Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	szt.	Urząd Gminy Dębica	0,35	0,36	0,40	0,83	0,67	0,40	0,63	0,32	0,70	0,27	0,72
Cel 2. Poprawa warunków życia mieszkańców	Powierzchnia terenów zagospodarowanych pod działalność sportową, rekreacyjną, kulturową i turystyczną przypadająca na 100 mieszkańców	ha	Urząd Gminy Dębica	0,6	0,3	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Budynki mieszkalne nowo oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców	szt.	Urząd Gminy Dębica	4,4	35,5	7,0	0,0	44,7	0,0	44,9	0,0	49,9	0,0	66,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica

Na podstawie danych statystycznych obrazujących wskaźniki oddziaływania w okresie monitorowania objętym niniejszym sprawozdaniem, które zostały przedstawione w tabeli 2, dokonano analizy okresowych zmian na obszarze rewitalizacji w porównaniu do terenu całej gminy. Monitorowanie celów i kierunków działań przy pomocy ww. wskaźników ma za zadanie obserwację znaczenia działań rewitalizacyjnych w stymulacji pozytywnych i odwracaniu negatywnych zmian oraz długookresowych trendów rozwojowych.

Jednym z najważniejszych mierników przedstawiających stan realizacji celu rewitalizacji 1. *Zwiększenie tożsamości lokalnej oraz rozwój przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców* jest wskaźnik *udział % ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do ludności ogółem*, który obrazuje sytuację demograficzną na danym obszarze. Procesy demograficzne związane z ruchem naturalnym ludności wpływają zarówno na liczbę ludności, jak i na jej strukturę wiekową. Analizując udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do ludności ogółem obszaru rewitalizacji należy wskazać, że w porównaniu do średniej dla całej gminy struktura wiekowa mieszkańców obszaru rewitalizacji na przestrzeni całego badanego okresu sprawozdawczego przedstawia się w niekorzystnej proporcji, co świadczy o niskim i utrzymującym się na stałym poziomie kapitale młodych ludzi (wykres 1).

Wykres 1 Udział % ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do ludności ogółem

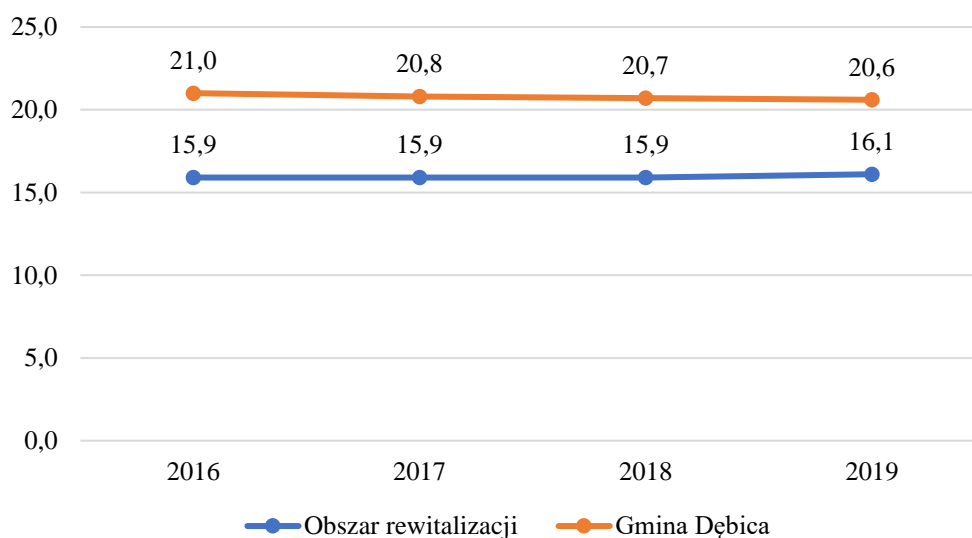


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica

Biorąc pod uwagę dane dotyczące przyrostu naturalnego w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania można stwierdzić, że wskaźnik ten wypada korzystniej niż średnia wartość dla gminy (wykres 2). Jednakże wskaźnik w badanym okresie miał wartość

ujemną – jest to niekorzystna sytuacja świadcząca o ubytku naturalnym na obszarze rewitalizacji.


Wykres 2 Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania

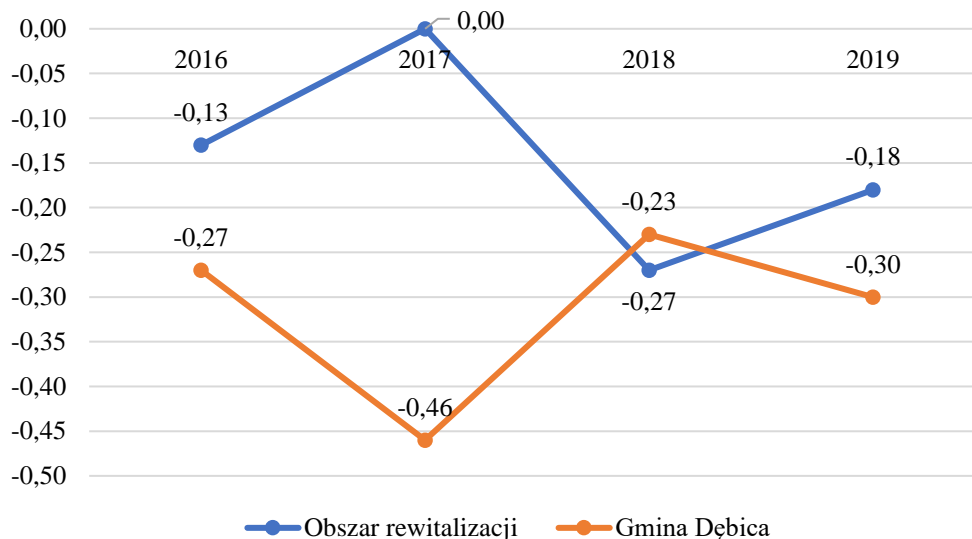

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica

Kolejnym wskaźnikiem jest *saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania*, czyli różnica między napływem a odpływem z danego obszaru w określonym czasie. Zmiany miejsca zamieszkania ludności odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu struktury i dynamiki ludności regionu, wpływając na liczbę ludności, gęstość zaludnienia, strukturę według wieku oraz płci, które to z kolei warunkują kolejne procesy ludnościowe, takie jak zawieranie małżeństw czy przyrost naturalny. Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji wskaźnik ten w okresie sprawozdawczym był wyższy niż średnia dla Gminy Dębica (wykres 3).


Wykres 3 Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania

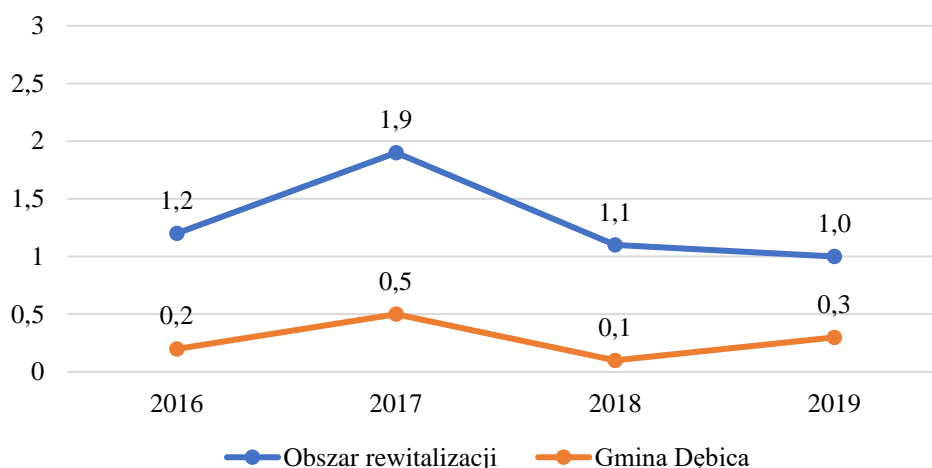

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica

Monitorowanie osiągnięcia celu rewitalizacji 1. *Zwiększenie tożsamości lokalnej oraz rozwój przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców* jest możliwe dzięki wskaźnikowi *udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania*. Z analizy danych obejmujących lata 2016–2019 wynika, że odsetek osób bezrobotnych na obszarze rewitalizacji systematycznie spadał. Należy również podkreślić, że wskaźnik ten dla obszaru rewitalizacji, w porównaniu do średniej dla całej gminy wypadł korzystnie w 2019 r. (wykres 4). Trzeba kontynuować i zintensyfikować działania przyczyniające się do aktywizacji osób bezrobotnych oraz dostosowania kompetencji i kwalifikacji mieszkańców do potrzeb rynku pracy.


Wykres 4 Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania

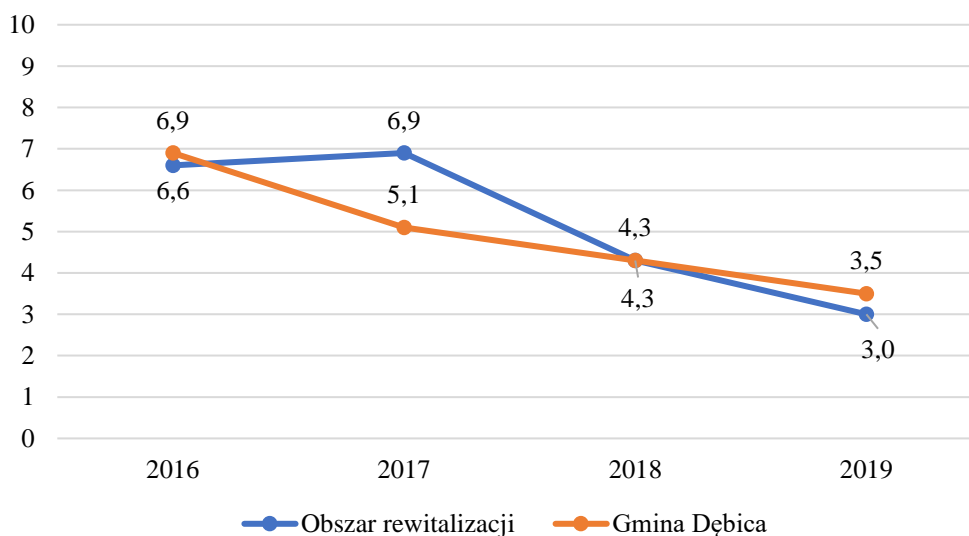

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy

Biorąc pod uwagę dane dotyczące *liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania* można zauważyć, że na wyznaczonym obszarze rewitalizacji wskaźnik ten w okresie sprawozdawczym był niższy niż średnia dla Gminy Dębica (wykres 5) – jedynie w 2018 r. wskaźnik ten był wyższy niż średnia dla gminy. Rozproszenie koncentracji problemów społecznych wpływa na jakość życia całej społeczności i osób korzystających z różnych usług czy aktywności na terenie gminy.


Wykres 5 Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania

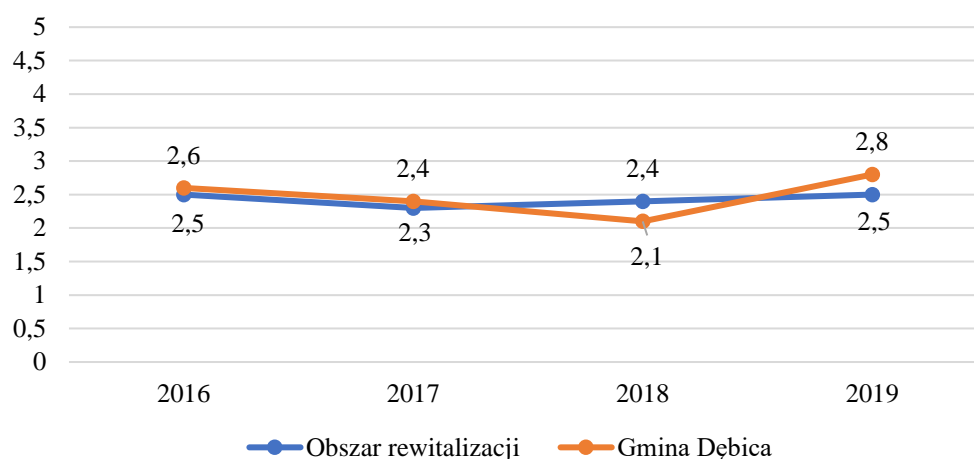

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

Wskaźnik dotyczący *liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania* w okresie sprawozdawczym na obszarze rewitalizacji był wyższy niż średnia dla gminy (wykres 6). Jednak można zauważyć niewielki spadek liczby osób korzystających z tego typu świadczeń na obszarze rewitalizacji w porównaniu do 2016 r. Należy prowadzić dalsze działania w sferze społecznej mające na celu zmniejszenie liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia.


Wykres 6 Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania

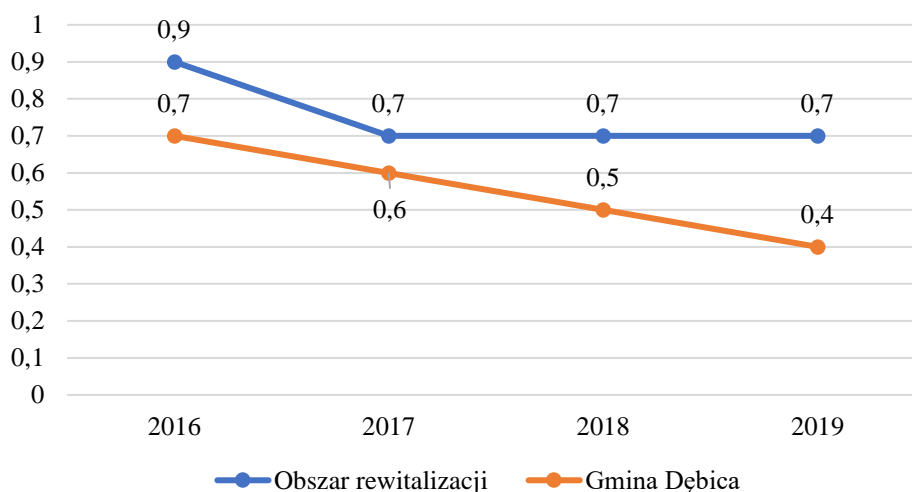

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

Kolejnym wskaźnikiem obrazującym aktywność lokalną jest *frekwencja w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (I tura)* z 2018 r. Frekwencja w wyborach na obszarze rewitalizacji była nieznacznie niższa niż średnia frekwencja dla całej gminy (wykres 7).


Wykres 7 Frekwencja w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (I tura)

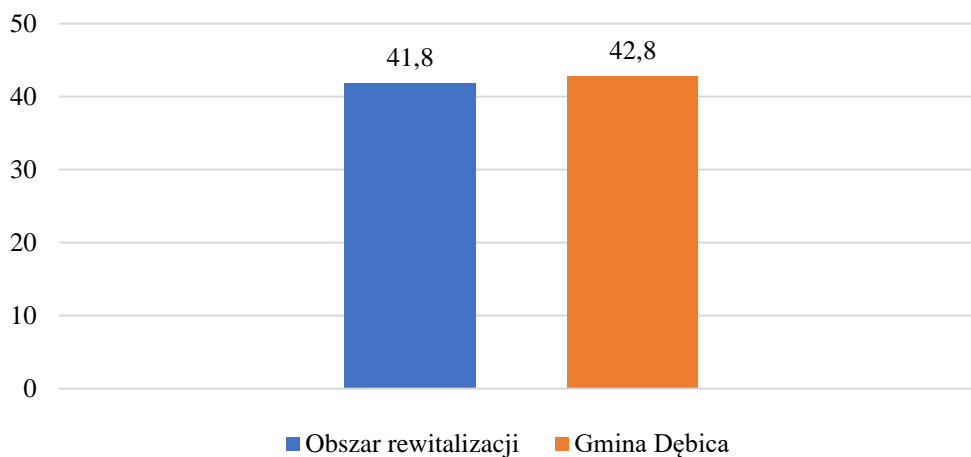

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica

Monitorowanie osiągnięcia celu rewitalizacji 1. *Zwiększenie tożsamości lokalnej oraz rozwój przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców* w zakresie przedsiębiorczości odbywa się poprzez wskaźnik *liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania*. Na obszarze rewitalizacji wskaźnik ten był niższy w porównaniu ze średnią dla Gminy Dębica, co świadczy o niższej aktywności gospodarczej mieszkańców (wykres 8).


Wykres 8 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania

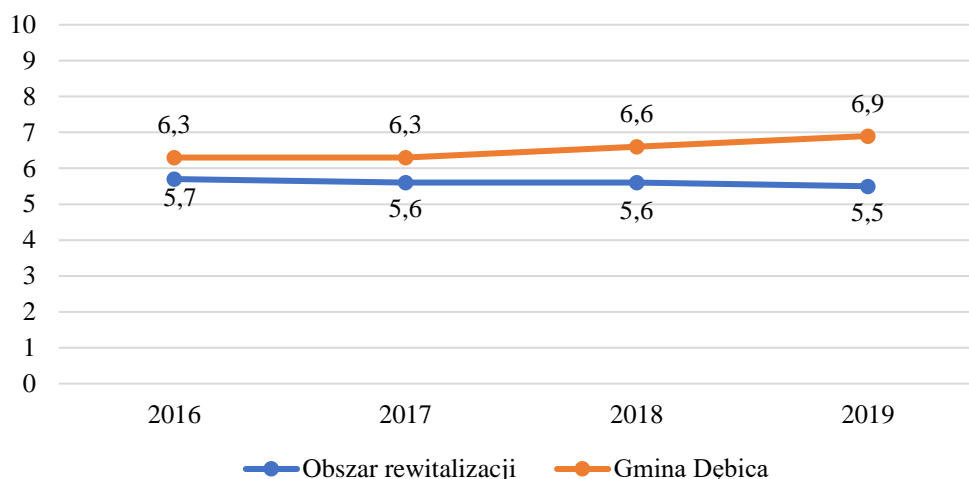

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica

Biorąc pod uwagę dane dotyczące liczby nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania można stwierdzić, że na obszarze rewitalizacji z roku na rok spada liczba nowo zarejestrowanych działalności gospodarczych w rejestrze REGON (wykres 9). To również świadczy o niewystarczającej przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji. Na tym terenie zlokalizowane są duże zakłady pracy, w których pracuje znaczna część mieszkańców obszaru.


Wykres 9 Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania

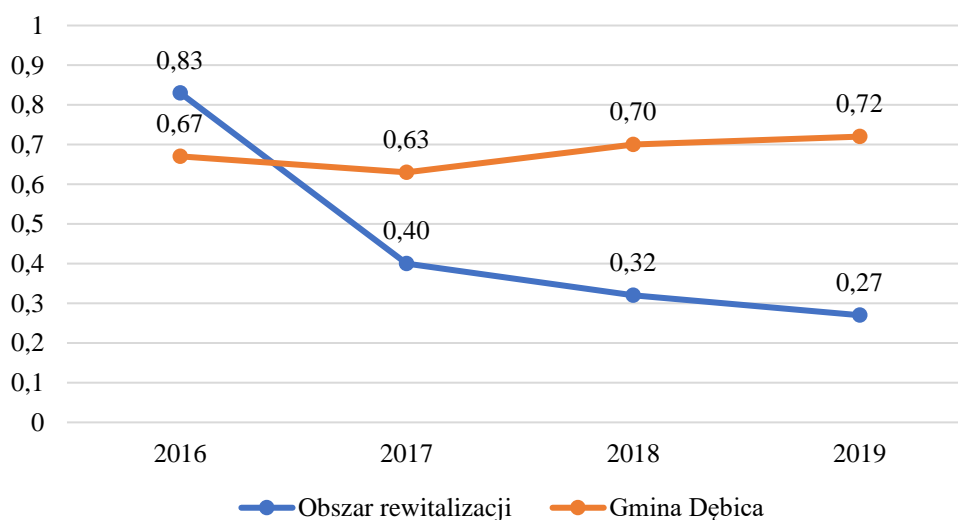

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica

Jednym z najważniejszych mierników przedstawiających stan realizacji celu rewitalizacji 2. *Poprawa warunków życia mieszkańców* jest wskaźnik *powierzchnia terenów zagospodarowanych pod działalność sportową, rekreacyjną, kulturową i turystyczną przypadająca na 100 mieszkańców*. Można stwierdzić, że stan zagospodarowania przestrzeni publicznych dla obszaru rewitalizacji w okresie sprawozdawczym utrzymywał się na tym samym poziomie, co średnia wartość dla gminy (wykres 10). Należy dalej prowadzić działania rewitalizacyjne w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, gdyż im szerzej będzie rozbudowana oferta rekreacyjna i kulturalna na poziomie lokalnym, tym bardziej będą mieszkańcy zadowoleni z miejsca zamieszkania i skłonni do działania obywatelskiego i aktywności społecznej na jego obszarze.


Wykres 10 Powierzchnia (w ha) terenów zagospodarowanych pod działalność sportową, rekreacyjną, kulturową i turystyczną przypadająca na 100 mieszkańców

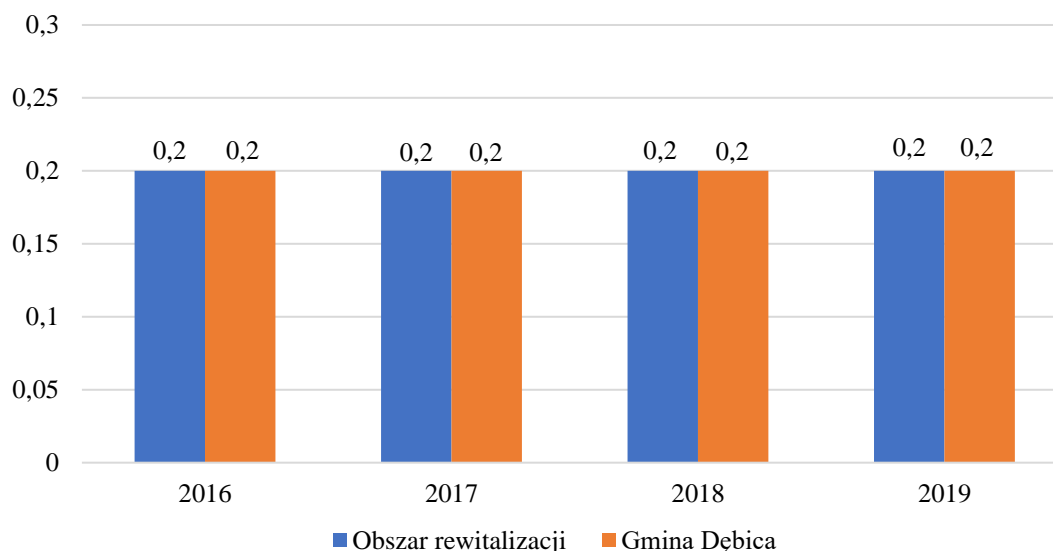

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica

Monitorowanie osiągnięcia celu rewitalizacji 2. *Poprawa warunków życia mieszkańców* odbywa się również poprzez dane dotyczące *budynków mieszkalnych nowo oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców*. W okresie sprawozdawczym na obszarze rewitalizacji nie oddano do użytkowania żadnego budynku mieszkalnego. Wynika to m.in. z faktu ograniczenia przestrzennego miejscowości. Dookoła są lasy będące w przeważającej większości w zarządzie Lasów Państwowych.

Wykres 11 Budynki mieszkalne nowo oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców

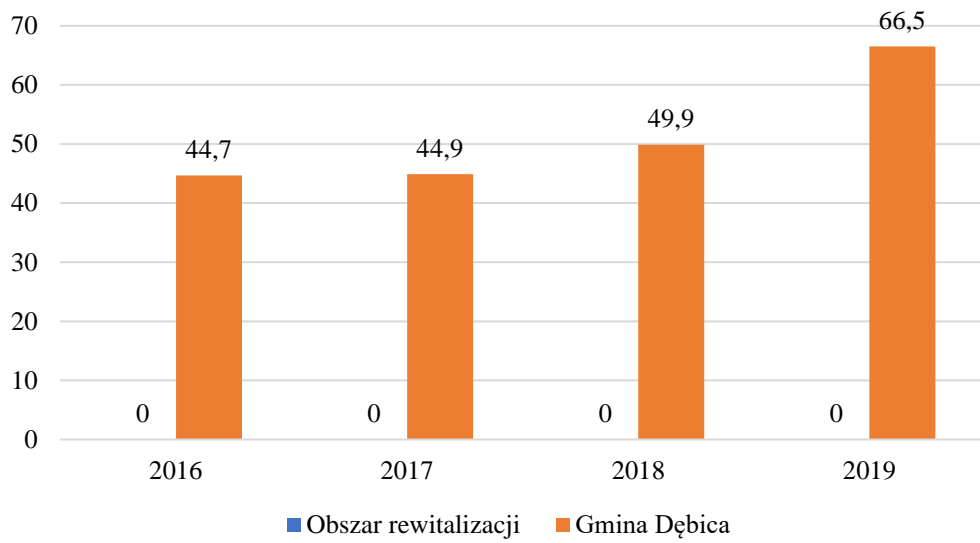

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica

2.2. Analiza osiągniętych wskaźników w odniesieniu do projektów podstawowych i przedsięwzięć uzupełniających

Monitorowanie procesu rewitalizacji ma na celu obserwację tempa oraz zgodności działań z uchwalonym Gminnym Programem Rewitalizacji, a także kontekstu wpływającego na powodzenie poszczególnych projektów i przedsięwzięć.

Monitoring rzeczowy dostarczył danych na temat aktualnego stanu realizacji dokumentu poprzez analizę wskaźników produktu i rezultatu, przyporządkowanych do konkretnych projektów podstawowych i/lub przedsięwzięć uzupełniających. Efekty wdrażania dokumentu monitorowane są za pomocą wskaźników, których wartość wyliczana i podawana jest na podstawie zbieranych corocznie w tym celu od Beneficjentów projektów aktualnych danych dla zaplanowanych działań realizowanych na obszarze rewitalizacji. Stan osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu na dzień 31.12.2019 roku w odniesieniu do poszczególnych projektów podstawowych zawarto w tabeli 3, natomiast łączne wartości danego wskaźnika produktu i rezultatu dla całego obszaru przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 3 Wskaźniki produktu i rezultatu w odniesieniu do poszczególnych projektów podstawowych

Lp.	Nazwa projektu	Wskaźniki	Wartość wskaźnika wg stanu na 31.12.2019 r.
1.	<i>Rewitalizacja przestrzenna Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego w celu ograniczenia problemów społecznych wynikających z programów rewitalizacyjnych gmin partnerskich</i>	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]	0,07
		Liczba zmodernizowanych elektrycznie budynków [szt.]	1
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]	1
		Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]	0
		Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]	0
2.	<i>Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Pustków-Osiedle</i>	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]	0
		Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [szt.]	0
		Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu [os.]	0
		Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]	0
		Liczba zdegradowanych budynków zaadaptowanych do celów publicznych [szt.]	0
3.	<i>Aktywni razem w Pustkowie-Osiedlu</i>	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [os.]	0
		Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [os.]	0
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [os.]	0
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu [os.]	0
4.	<i>Rodzina siłą przyszłości</i>	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [os.]	0

		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie [os.]	0
5.	<i>Rozwój Kompleksu Rekreacyjno-Turystycznego w Pustkowie-Osiedlu</i>	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]	0
		Liczba wybudowanych urządzeń/obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej [szt.]	0
		Liczba osób korzystających rocznie z powstałej infrastruktury rekreacyjnej/sportowej/turystycznej [os./rok]	0
		Liczba nowych usług sportowo-rekreacyjnych [szt.]	0
6.	<i>Uporządkowanie obszarów leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Dębica</i>	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]	0
		Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (liczba odbiorców działań) [os.]	0
		Liczba osób korzystających rocznie z powstałej infrastruktury rekreacyjnej/sportowej/turystycznej [os.]	0
7.	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1284R Ostrów – granica powiatu – Dębica w miejscowości Pustków-Osiedle</i>	Długość przebudowanych dróg powiatowych [km]	0,95
		Długość wybudowanych chodników/ ścieżek rowerowych/ ciągów pieszo-rowerowych [km]	1,9
		Średni czas przejazdu między dwoma punktami (początkiem i końcem odcinka drogi) [min.]	1
8.	<i>Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej mienia komunalnego Gminy Dębica w miejscowości Pustków-Osiedle</i>	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]	1,14
		Liczba osób korzystających rocznie z powstałej infrastruktury rekreacyjnej/sportowej/turystycznej [os.]	0
9.	<i>UNIwersytet Młodego Człowieka – edukacja, integracja, rozwijanie pasji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu</i>	Liczba zorganizowanych szkoleń/warsztatów/zajęć/spotkań [szt.]	0
		Liczba osób objętych wsparciem [os.]	0
		Ilość utworzonych grup wsparcia [szt.]	0
10.	<i>Poprawa jakości życia mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży</i>	Liczba osób objętych wsparciem [os.]	0
		Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych [szt.]	0
		Wzrost aktywności społecznej i tożsamości lokalnej mieszkańców (liczba uczestników spotkań/imprez) [os.]	0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica

Tabela 4 Wskaźniki produktu i rezultatu – wartości osiągnięte łącznie wg stanu na 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Źródło informacji	Wartość bazowa dla obszaru rewitalizacji (stan na 31.12.2014 r.)	Wartość docelowa (stan na dzień 31.12.2024 r.)	Wartość osiągnięta dla obszaru rewitalizacji (stan na 31.12.2019 r.)	Poziom osiągnięcia określonej wartości docelowej wg stanu na dzień 31.12.2024 r. (%)
1.	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	ha	Beneficjenci projektów	0	8,7	0,07	0,80
2.	Liczba zmodernizowanych elektrycznie budynków	szt.	Beneficjenci projektów	0	3	1	33,33
3.	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	szt.	Beneficjenci projektów	0	3	1	33,33
4.	Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej	GJ/rok	Beneficjenci projektów	0	0,4	0	0,00
5.	Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWh/rok	Beneficjenci projektów	0	400	0	0,00
6.	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	szt.	Beneficjenci projektów	0	70	0	0,00
7.	Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu	os.	Beneficjenci projektów	0	90	0	0,00
8.	Liczba zdegradowanych budynków zaadaptowanych do celów publicznych	szt.	Beneficjenci projektów	0	1	0	0,00
9.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	os.	Beneficjenci projektów	0	40	0	0,00
10.	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	os.	Beneficjenci projektów	0	6	0	0,00
11.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	os.	Beneficjenci projektów	0	30	0	0,00
12.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu	os.	Beneficjenci projektów	0	15	0	0,00

13.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	os.	Beneficjenci projektów	0	60	0	0,00
14.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie	os.	Beneficjenci projektów	0	40	0	0,00
15.	Liczba wybudowanych urządzeń/obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	szt.	Beneficjenci projektów	0	3	0	0,00
16.	Liczba osób korzystających rocznie z powstałej infrastruktury rekreacyjnej/sportowej/turystycznej	os./rok	Beneficjenci projektów	0	1 500	0	0,00
17.	Liczba nowych usług sportowo-rekreacyjnych	szt.	Beneficjenci projektów	0	3	0	0,00
18.	Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (liczba odbiorców działań)	os.	Beneficjenci projektów	0	400	0	0,00
19.	Długość przebudowanych dróg powiatowych	km	Beneficjenci projektów	0	1,3	0,95	73,08
20.	Długość wybudowanych chodników/ ścieżek rowerowych/ ciągów pieszko-rowerowych	km	Beneficjenci projektów	0	1,3	1,9	146,15
21.	Średni czas przejazdu między dwoma punktami (początkiem i końcem odcinka drogi)	min.	Beneficjenci projektów	0	Wartość zostanie określona na podstawie dokumentacji przed realizacją projektu	1	0,00
22.	Liczba zorganizowanych szkoleń/warsztatów/zajęć/spotkań	szt.	Beneficjenci projektów	0	12	1,14	9,50
23.	Liczba osób objętych wsparciem	os.	Beneficjenci projektów	0	500	0	0,00
24.	Ilość utworzonych grup wsparcia	szt.	Beneficjenci projektów	0	3	0	0,00
25.	Wzrost aktywności społecznej i tożsamości lokalnej mieszkańców (liczba uczestników spotkań/imprez)	os.	Beneficjenci projektów	0	500	0	0,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica

3. Sprawozdanie z monitoringu finansowego

3.1. Analiza wykonania finansowego projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Monitoring finansowy dostarcza danych na temat poniesionych nakładów oraz wykorzystanych źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków. Dane odnoszą się zarówno do projektów, które gmina realizuje samodzielnie, do tych, w których jest tylko jednym z partnerów, jak i tych, które realizowane są w programie rewitalizacji przez podmioty niezależne od gminy. Informacje zawarte w niniejszym raporcie obejmują m.in. wysokość wkładu własnego i pozyskanych środków zewnętrznych, wydatki poniesione w okresie objętym monitoringiem, procentowy stan zaawansowania realizacji inwestycji, okres realizacji, a także informacje na temat zakresu rzeczowego przedsięwzięć.

W tabeli 5 przedstawiono analizę zaplanowanego finansowego harmonogramu wdrażania wraz ze wskazaniem źródeł finansowania projektów podstawowych ujętych w GPR, natomiast w tabeli 6 – przedsięwzięć uzupełniających ujętych w programie.

Tabela 5 Analiza wykonania finansowego projektów podstawowych ujętych w GPR

ZAKŁADANY PLAN REALIZACJI GPR						WYKONANIE PLANU REALIZACJI GPR wg stanu na 31.12.2019 r.								
Lp.	Nazwa projektu	Podmioty realizujące	Lokalizacja	Okres realizacji	Szacowana wartość brutto (w mln zł)	Stan realizacji (tak/nie/częściowo)	Podmioty realizujące	Uwagi do zakresu rzeczowego	Okres realizacji	Wartość projektu brutto (w złotych)	Źródła i wartość finansowania (w złotych)	Dotychczas poniesione wydatki (w złotych)	Wydatki (w zł) poniesione w okresie sprawozdawczym (2016–2019)	% stan realizacji projektu
1.	<i>Rewitalizacja przestrzenna Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego w celu ograniczenia problemów społecznych wynikających z programów rewitalizacyjnych gmin partnerskich</i>	Gmina Dębica, partner społeczny/gospodarczy (wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą wdrożeniową), gminy partnerskie DROF	Obszar rewitalizacji (Pustków-Osiedle nr 33,47)	2019–2020	5,0	NIE	Gmina Dębica	Remont budynku socjalnego nr 47 w Pustkowie-Osiedlu. W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane obejmujące remont budynku socjalnego nr 47 w Pustkowie-Osiedlu wraz z wymianą i modernizacją instalacji wod.-kan., c.o. i elektrycznej w częściach wspólnych budynku. Zadanie obejmuje także dostawę wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania budynku socjalnego.	2021	760 742,74	Dotacja RPO WP 2014–2020: 395 037,78 Budżet Gminy: 313 033,25 Budżet państwa: 52 671,71	0,00	0,00	0,00
2.	<i>Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Pustków-Osiedle</i>	Gmina Dębica	Obszar rewitalizacji (Pustków-Osiedle nr 33)	2020–2021	2,0	NIE	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
3.	<i>Aktywni razem w Pustkowie-Osiedlu</i>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy	Obszar rewitalizacji (Pustków-Osiedle nr 47)	2021–2022	0,8	NIE	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
4.	<i>Rodzina siłą przyszłości</i>	Gmina Dębica, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy	Obszar rewitalizacji (Pustków-Osiedle nr 33)	2021–2023	0,9	NIE	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
5.	<i>Rozwój Kompleksu Rekreacyjno-Turystycznego w Pustkowie-Osiedlu</i>	Gmina Dębica	Obszar rewitalizacji (Pustków-Osiedle nr 36A)	2019–2021	2,5	NIE	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
6.	<i>Uporządkowanie obszarów leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Dębica</i>	Nadleśnictwo Dębica, Gmina Dębica	Obszar rewitalizacji (dz. ewid. 3665, obręb 16)	2018	0,1	NIE	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
7.	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1284R Ostrów – granica powiatu – Dębica w miejscowości Pustków-Osiedle</i>	Powiat dębicki, Gmina Dębica	Obszar rewitalizacji (dz. ewid. 3589, obręb 16)	2019–2020	2,0	TAK	Gmina Dębica	Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej nr 1284R Pustków-Osiedle od km 5+200 do km 6+150.	2019–2020	2 428 159,74	Dotacja RPO WP 2014–2020: 1 821 119,80	2 428 159,74	2 428 159,74	100,0

								W ramach zadania przebudowana została jezdnia i układ odwodnienia drogi, a także wykonane zostały chodniki, ścieżki rowerowe, zatoka autobusowa.			Budżet Gminy: 364 223,97 Budżet państwa: 242 815,97			
8.	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej mienia komunalnego Gminy Dębica w miejscowości Pustków-Osiedle	Gmina Dębica	Obszar rewitalizacji (dz. ewid. 3589, w obrębie Pustków-Osiedle)	2019	0,5	NIE	Gmina Dębica	Zadanie obejmuje urządzenie placu zabaw: piaskownica kwadratowa, huśtawka podwójna wahadłowa, domek z podestem, dwa sprężynowce, budka krasnoludka metalowa, zestaw zabawowy, karuzela z czterema siedziskami, drabinka pozioma, ruchomy pomost, huśtawka wałka bez oparcia z oponami, zestaw zabawowy, labirynt oraz wyposażenie placu: stojak na rowery 6-stanowiskowy, 6 koszy na śmieci, 12 ławek parkowych i regulamin placu zabaw.	2020–2021	186 335,21	PROW 2014–2020: 118 565,00 Budżet Gminy: 67 770,21	0,00	0,00	0,00
9.	UNIwersytet Młodego Człowieka – edukacja, integracja, rozwijanie pasji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Gmina Dębica, Stowarzyszenie Na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży Nasza Sprawa, partnerzy społeczni (stowarzyszenia, organizacje pozarządowe)	Obszar rewitalizacji	2019–2022	1,0	NIE	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
10.	Poprawa jakości życia mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży	Gmina Dębica, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, grupy nieformalne	Obszar rewitalizacji	2018–2023	1,5	NIE	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica

Analiza wykonania projektów podstawowych pod względem finansowym w okresie objętym sprawozdaniem pozwala na stwierdzenie, że z łącznej liczby 10 zaplanowanych projektów podstawowych ujętych w GPR, zakończono realizację jednego projektu. Zadania nr 1 i 8 uzyskały dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WP na lata 2014–2020 i zostały podpisane umowy o dofinansowanie z instytucją zarządzającą, jednakże prace zostaną dopiero podjęte i ukończone w 2021 roku. Stan zaawansowania wdrożenia projektów podstawowych wynosi 10,0%. Realizacja wszystkich zaplanowanych projektów podstawowych jest kluczowa dla powodzenia procesu rewitalizacji oraz osiągnięcia założonych efektów, ponieważ tylko kompleksowe działania o charakterze zarówno inwestycyjnym, jak i społecznym, przyczynią się do osiągnięcia założonych rezultatów.


Przedsięwzięcia podstawowe nie zostały zrealizowane w zakładanym stopniu, gdyż nie udało się pozyskać dotacji ze środków zewnętrznych. Budżet Gminy Dębica nie jest wystarczająco duży, aby pokryć całkowite wydatki planowanych zadań. Niemniej jednak, jeżeli pojawi się możliwość pozyskania funduszy ze środków zewnętrznych, gmina będzie wnioskować o takie dofinansowanie.

Zgodnie z informacjami podanymi w tabeli 5. nakłady inwestycyjne dotychczas poniesione na wszystkie zrealizowane oraz rozpoczęte inwestycje i projekty społeczne w okresie sprawozdawczym (lata 2016–2019) wyniosły 2 428 159,74 zł. Głównymi źródłami finansowania były przede wszystkim fundusze Unii Europejskiej oraz środki z budżetu gminy, budżetu państwa. Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

- dotacje z UE w ramach RPO WP na lata 2014–2020: 1 821 119,80 zł;
- budżet Gminy Dębica: 364 223,97 zł;
- budżet państwa: 242 815,97.

Na wykresie 12 przedstawiono udział procentowy źródeł finansowania rozpoczętych i zrealizowanych podstawowych projektów rewitalizacyjnych.


Wykres 12 Udział % źródeł finansowania rozpoczętych i zrealizowanych podstawowych projektów rewitalizacyjnych

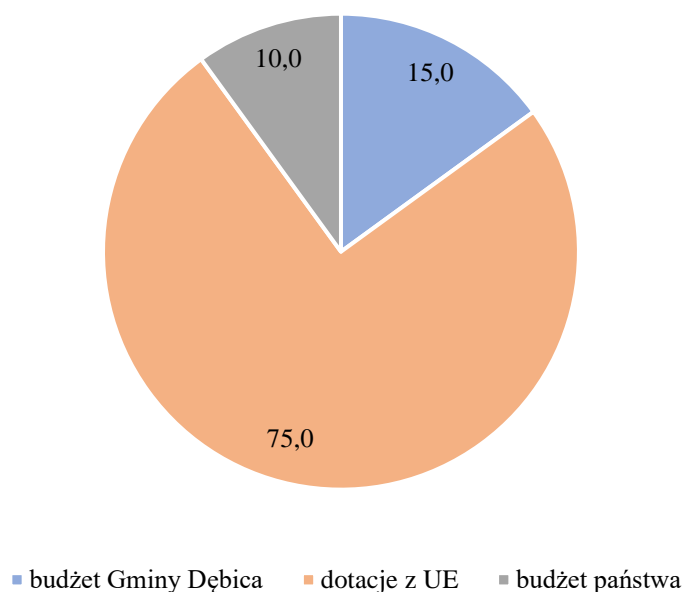

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica

Na wykresie 13 porównano poniesione całkowite wydatki na jedyny zrealizowany projekt podstawowy z wartościami oszacowanymi na etapie sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016–2024. Analizując te dane należy zauważyć, że nakłady rzeczywiście poniesione na projekt nr 7. pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284R Ostrów – granica powiatu – Dębica w miejscowości Pustków-Osiedle” są wyższe niż wartości oszacowane, które zostały ujęte w GPR. Jest to niewątpliwie spowodowane rosnącymi cenami materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz świadczonych w tym zakresie usług firm wykonawczych.

Wykres 13 Porównanie szacowanej wartości w GPR i rzeczywistej wartości projektów podstawowych po realizacji (w złotych)

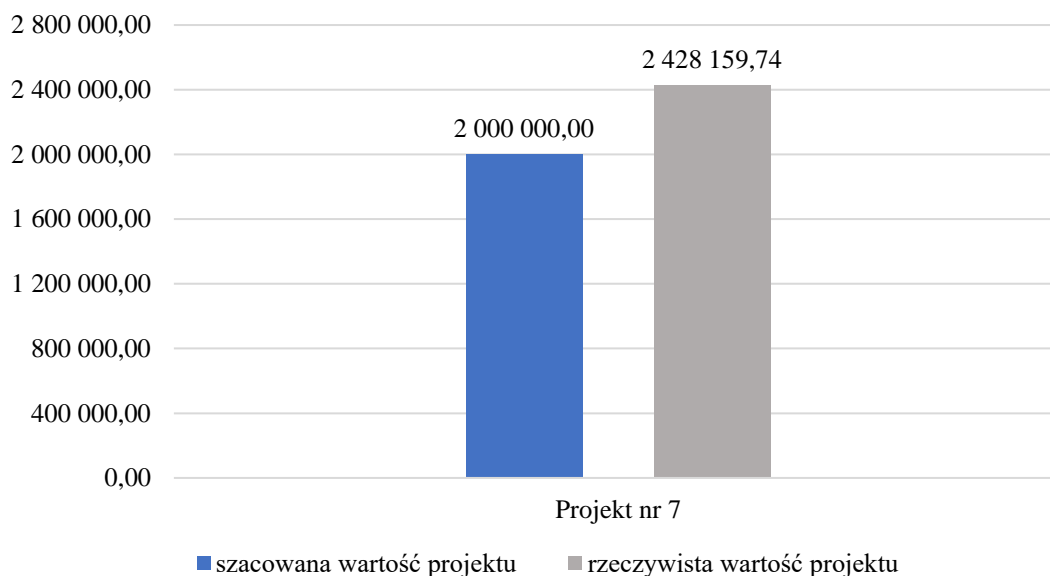

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica

Głównym podmiotem realizującym przedsięwzięcia podstawowe jest Gmina Dębica. Okres realizacji zakończonego projektu wpisuje się w założenia przyjęte w programie. Według założeń Gminnego Programu Rewitalizacji inwestycje jeszcze niezrealizowane lub nawet nierozpoczęte mają zostać zrealizowane do końca 2024 roku.

Stopień zaawansowania projektów rozpoczętych, czyli projektów nr 1 i 8 wynosi 0%, gdyż na chwilę obecną Gmina Dębica uzyskała dofinansowanie na inwestycje, jednak nie zostały podjęte prace budowlane.

Tabela 6 Analiza wykonania finansowego przedsięwzięć uzupełniających ujętych w GPR

WYKONANIE PLANU REALIZACJI GPR wg stanu na 31.12.2019 r.								
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia uzupełniającego	Podmioty realizujące	Tytuł projektu	Okres realizacji	Wartość projektu brutto (w złotych)	Źródła i wartość finansowania (w złotych)	Nazwa programu	Zakres rzeczowy
1.	Wykorzystanie technologii opartej o odnawialne źródła energii oraz prowadzenie działań termomodernizacyjnych przyczyniających się do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej, działalności gospodarczych i mieszkaniowych (w tym wielorodzinnych)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.
2.	Stworzenie systemu wspierania przedsiębiorczości mieszkańców (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.
3.	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i wychowania przedszkolnego	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.
4.	Tworzenie infrastruktury społecznej, zdrowotnej i opiekuńczej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy	Nie dotyczy	2016–2019	1 158 323,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	W latach 2016–2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy finansował świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych oraz pomoc sąsiedzką w następujący sposób: <ul style="list-style-type: none"> specjalistyczne usługi opiekuńcze: na terenie Gminy Dębica pomoc uzyskało 84 mieszkańców, z czego 9 osób z Pustkowie-Osiedle; usługi opiekuńcze: na terenie Gminy Dębica pomoc uzyskało 52 mieszkańców, z czego 11 osób z Pustkowie-Osiedle.
5.	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych marginalizacją społeczną	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.
6.	Organizowanie zajęć rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica	Nie dotyczy	2016–2019	b.d	b.d	b.d	<p>Halowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej „Zostań Mistrzem”: W zawodach biorą udział uczniowie z Zespołów Szkół Gminy Dębica. Zawody odbywają się w hali sportowej w Pustkowie-Osiedlu. Każda szkolna reprezentacja występuje w mistrzostwach pod flagą wybranego państwa oraz Gminy Dębica, walcząc o Puchar Wójta Gminy Dębica.</p> <p>Halowy Turniej Piłki Nożnej Sołectwa Stasiówka: Halowy Turniej o puchar sołectwa Stasiówka ma za zadanie poszerzyć ofertę lokalnych imprez dla mieszkańców oraz zacieśnić relacje między nimi poprzez wspólną integrację oraz sportową rywalizację.</p> <p>Gminna Liga Amatorska Piłki Siatkowej „GLAPS”: Każdego roku drużyny z terenu Gminy Dębica rywalizują o miano najlepszego siatkarskiego zespołu gminy. Rozgrywki prowadzone są w dwóch rundach: jesiennej i zimowej. Zwieńczeniem sezonu jest mecz finałowy o zwycięstwo w całych rozgrywkach oraz ceremonia wręczenia nagród i pucharów dla wszystkich drużyn.</p> <p>Turniej Piłki Siatkowej Sołectw Gminy Dębica: Turniej rozgrywany jest na hali sportowej Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu. Reprezentanci poszczególnych sołectw rywalizują między sobą o Puchar Wójta Gminy Dębica.</p> <p>Memorial Pływacki im. Jana Pawła II w Rocznicę Śmierci:</p>

							<p>Memoriał Pływacki im. Jana Pawła II w Rocznicę Śmierci, poprzez pływanie ma na celu oddanie hołdu zmarłemu Papieżowi, tym samym upamiętniając jego życie i pontyfikat.</p> <p>Zawody organizowane na krytej pływalni Kompleksu Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu z cyklu „Już pływam” skierowane dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy, które dodatkowo są objęte bezpłatną nauką pływania. Dzięki temu najmłodszy uczniowie mają okazję współrywalizować ze swoimi rówieśnikami, a przy tym mogą sprawdzić swoje umiejętności pływackie.</p> <p>Gminna Spartakiada Sportowo-Lekkoatletyczna połączona z Integracyjnym Turniejem dla Dzieci i Młodzieży: Spartakiada gromadzi młodych entuzjastów przeróżnych dyscyplin sportowych, sprawiając, że każdego roku w Gminie Dębica ma miejsce wielkie święto sportu – namiastka własnej Olimpiady.</p> <p>Bieg „Wzgórze OCR”: Wszystkie osoby biorące udział w biegu mają do pokonania trasę o długości ok. 7 km oraz ponad 21 różnych przeszkód, m.in.: 2,5 metrowa ściana, równoważnia, slack line, olympus, multiring, kołki w ziemi, tor z gumkami na nogach, spacer farmera z belkami, worki z piaskiem, wiadra z piaskiem, rzut oszczepem, poręcz, podwójna drabinka, 5 metrowa lina, wyciąganie worków na linach i inne.</p> <p>Rozpoczęcie wakacji i sezonu kąpielowego: Otwarcie basenu zewnętrznego na Kompleksie Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu, połączone z animacjami, grami i zabawami dla wszystkich klientów.</p> <p>Gminna Liga Lekkoatletyczna: Ponad 300 uczniów z 13 szkół z terenu Gminy Dębica bierze udział w rozgrywkach lekkoatletycznych występując w takich konkurencjach jak: biegi dystansowe, rzut piłką palantową, oszczepem, piłką lekarską, pchnięcie kulą, skok w dal, skok wzwyż oraz bieg po kopercie.</p> <p>Ogólnopolski Splyw Kajakowy rzeką Wisłoka: W imprezie co roku bierze udział blisko 100 kajakarzy. Wszyscy uczestnicy muszą mierzyć się z trasą liczącą ok. 25 km oraz wieloma trudnościami, jakie przygotowała na nich rzeka na całej swej długości.</p> <p>Otwarte Mistrzostwa Powiatu Dębickiego w Kolarstwie Górskim w konkurencji XC: Zawody odbywają się na specjalnie przygotowanej trasie na stoku narciarskim w Stobiernej. Do rywalizacji przystępują profesjonalni zawodnicy, amatorzy oraz najmłodszy miłośnicy jazdy na rowerze. Na zawodników czekają dwie trasy: dla najmłodszych o długości 500 m, natomiast dla dorosłych bardzo wymagająca pod względem kondycyjnym pętla mierząca ponad 2600 m.</p> <p>Charytatywny Bieg Dzikich Mustangów: Bieg ten to połączenie sportowej rywalizacji z akcją charytatywną, gdzie każdego roku zbierane są środki pieniężne na pomoc chorym dzieciom z terenu Gminy Dębica. Szereg atrakcji, gier i zabaw towarzyszących, sportowa rywalizacja w duchu fair play i szczytny cel, który łączy to wszystko w jedną z najlepszych imprez biegowych na terenie powiatu dębickiego.</p> <p>Bieg Partyzanta „Szlakiem Akcji Burza”: Bieg przebiega leśnymi terenami Gminy Dębica. Celem biegu jest przede wszystkim upamiętnienie historii o poległych i pomordowanych żołnierzach Armii Krajowej, którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski na terenie powiatu, jak również popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej pozytywnie wpływającej na ogólną sprawność fizyczną i zdrowie.</p> <p>Kino Letnie na Kompleksie Basenów Zewnętrznych „NEMO”: Poszerzając ofertę wakacyjną dla mieszkańców Gminy Dębica organizowane jest kino letnie, podczas którego w wakacyjne wieczory wyświetlane są różne filmy zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.</p> <p>Plażowy Turniej Piłki Siatkowej: Impreza organizowana w sezonie letnim podczas funkcjonowania basenu zewnętrznego na Kompleksie Basenów „NEMO”. Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju rywalizują w kategorii open, walczą o cenne i atrakcyjne nagrody, łącząc tym samym sportową rywalizację z aktywnym wypoczynkiem nad wodą.</p> <p>Gminny Bieg Niepodległości:</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

								W ramach obchodów upamiętnienia odzyskania przez Polskę Niepodległości, w Brzeźnicy organizowany jest Gminny Bieg Niepodległości. Bierze w nim udział ok. 300 uczestników z wszystkich szkół Gminy Dębica. Mikołajkowe Zawody Pływackie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dębica: Zawody pływackie dla uczniów z klas I-III wszystkich szkół z terenu Gminy Dębica, w ramach zajęć bezpłatnej nauki pływania. Oprócz nagród rzeczowych, na specjalne zaproszenie wszystkie dzieci odwiedza św. Mikołaj.
7.	Zagospodarowanie i adaptacja przestrzeni w obszarach wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz prowadzenia aktywności społecznej i gospodarczej	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.
8.	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.
9.	Tworzenie i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica	Nie dotyczy	2016–2019	380 724,64	Nie dotyczy	Nie dotyczy	W skład inwestycji wchodziły: - zakup i montaż trybuny boiskowej na boisku sportowym LKS Stasiówka: 21 648 zł; - zakup i montaż nowego piłkochwytu na boisko sportowe LKS Paszczyniak Paszczyna: 7 995 zł; - zakup nowej zjeżdżalni rurowej na basen zewnętrzny Kompleksu Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu: 38 007 zł; - Mobilny Park Linowy na basen zewnętrzny Kompleksu Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu: 38 000 zł; - ławki w kształcie delfina i rekina na basen zewnętrzny Kompleksu Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu: 30 000 zł; - rodzinny żółwi hamak na basen zewnętrzny Kompleksu Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu: 34 999,99 zł; - kosiarka samojezdna Oleo-Mac – na boisko sportowe w Zawadzie: 11 698 zł; - wykonanie zabezpieczenia osuwającej się skarpy na boisku sportowym LKS Stasiówka: 31 933,41 zł; - wykonanie ogrodzenia boiska treningowego w miejscowości Podgrodzie: 26 673 zł; - wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową przy pawilonie sportowym na boisku LKS Stasiówka: 8 200,10 zł; - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego LKS Baszta Zawada: 18 505,13 zł; - zakup dwóch przenośnych aluminiowych bramek do piłki nożnej na boisko sportowe w Pustkowie-Osiedlu: 5 500 zł; - traktorki ogrodowe wraz z wyposażeniem na boiska sportowe MULKS Pustynia oraz KS Chemik Pustków: 35 611,01 zł; - renowacja płyty boiska sportowego LKS Brzeźnica: 6 848 zł; - wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego i bieżni lekkoatletycznej w Pustkowie Osiedlu: 50 000 zł; - wykonanie dwóch pełnowymiarowych boisk do siatkówki plażowej przy basenie zewnętrznym Kompleksu Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu: 15 107 zł.
10.	Organizacja ponadregionalnych cyklicznych wydarzeń kulturalnych	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

Analiza wykonania przedsięwzięć uzupełniających pod względem finansowym w okresie objętym sprawozdaniem pozwala na stwierdzenie, że z łącznej liczby 10 zaplanowanych projektów uzupełniających rozpoczęto realizację działań w ramach 3 typów przedsięwzięć. Realizacja wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć uzupełniających jest kluczowa dla powodzenia procesu rewitalizacji oraz osiągnięcia założonych efektów, ponieważ tylko kompleksowe działania o charakterze zarówno inwestycyjnym jak i społecznym przyczynią się do osiągnięcia założonych rezultatów.

Z przedsięwzięć uzupełniających nie podjęto jeszcze realizacji działań w zakresie: *wykorzystanie technologii opartej o odnawialne źródła energii oraz prowadzenie działań termomodernizacyjnych przyczyniających się do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej, działalności gospodarczych i mieszkaniowych (w tym wielorodzinnych), stworzenie systemu wspierania przedsiębiorczości mieszkańców (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji), rozwój infrastruktury edukacyjnej i wychowania przedszkolnego, aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych marginalizacją społeczną, zagospodarowanie i adaptacja przestrzeni w obszarach wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz prowadzenia aktywności społecznej i gospodarczej, termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz organizacja ponadregionalnych cyklicznych wydarzeń kulturalnych.* Zadania te mają szansę zostać wdrożone do końca kolejnego okresu sprawozdawczego, czyli do końca 2022 roku.


Zgodnie z danymi w tabeli 6. nakłady inwestycyjne na wszystkie zrealizowane działania w okresie sprawozdawczym objętym raportem (lata 2016–2019) wyniosły 1 539 047,64 zł. Według założeń programu szacunkowa wartość projektów uzupełniających miała docelowo wynieść 10 000 000 zł. W związku z tym wykonano w 15% zakładany plan finansowania.

Głównym źródłem finansowania był budżet własny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica. Szczegółowy podział źródeł finansowania przedstawia się następująco:

- budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy: 1 158 323,00zł;
- budżet Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica: 380 724,64 zł.

Na wykresie 14 przedstawiono udział procentowy źródeł finansowania zrealizowanych przedsięwzięć uzupełniających ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Wykres 14 Udział % źródeł finansowania zrealizowanych przedsięwzięć uzupełniających

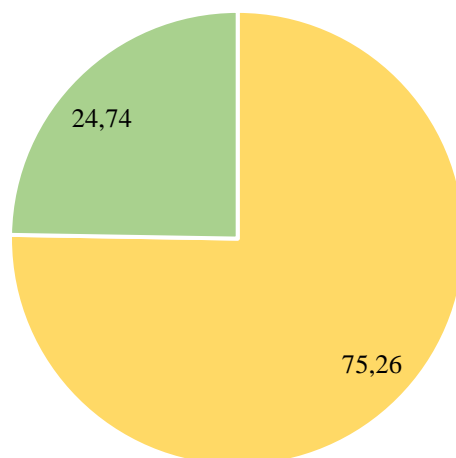

- budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy
- budżet Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica

Podmiotami realizującymi działania w ramach zaplanowanych przedsięwzięć uzupełniających jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica. W ramach tych przedsięwzięć zrealizowano wiele projektów, które przyczyniły się do eliminacji i ograniczenia negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Należy również zaznaczyć, że wzmacniają one zaplanowane efekty procesu rewitalizacji w odniesieniu do rozwoju społeczno-gospodarczego całej gminy.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza monitoringu założeń Gminnego Programu Rewitalizacji jest pierwszą od uchwalenia dokumentu w 2017 roku. W odniesieniu do założenia, że rewitalizacja jest procesem długofalowym, pierwsze trzy lata prowadzonych prac to bardzo krótki okres, aby uzyskać zadowalające zmiany na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Uchwalając dokument uznano, że rok 2024 będzie terminem granicznym dla prowadzonych działań i ich oceny. Trudno więc oczekiwać uzyskania zadowalających wyników w odniesieniu do wszystkich czynników kryzysowych obszaru rewitalizacji już po trzech latach realizacji prac, w sytuacji, gdy znaczna część projektów rewitalizacyjnych jest dopiero w trakcie lub została zaplanowana do realizacji w ciągu dalszego okresu wdrażania założeń programu.

Przeprowadzona analiza wskaźników oddziaływania dla obszaru rewitalizacji w porównaniu do średniej dla gminy (przedstawiona na wykresach 1–11) ukazuje częściową poprawę negatywnych zjawisk zidentyfikowanych na etapie diagnostycznym, która jest efektem m.in. zaplanowanych i wdrożonych projektów podstawowych i przedsięwzięć uzupełniających. Jednakże, aby osiągnąć zakładane cele rewitalizacji oraz zadowalający i trwały efekt należy kontynuować realizację rozpoczętego procesu rewitalizacji.

Wszystkie projekty podstawowe, które nie zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w latach 2016–2019, mają dużą szansę być zrealizowane w zakładanym pierwotnie terminie. W okresie sprawozdawczym lat 2016–2019, żaden z potencjalnych interesariuszy rewitalizacji nie zgłosił nowych projektów do realizacji, a także nie wystąpił o modyfikację działań ujętych w programie. Nie wystąpiły zatem przesłanki do aktualizacji programu w tym zakresie.

Wyniki monitorowania odwzorowane we wskaźnikach produktu i rezultatu przypisanych do konkretnych projektów, wskazują na pozytywne mierzalne efekty interwencji rewitalizacyjnej na terenie Gminy Dębica. W tym zakresie rekomenduje się kontynuację założeń wynikających z opracowanego GPR, szczególnie w zakresie projektów społecznych.

Rewitalizacja prowadzona jest nie tylko dzięki środkom z budżetu gminy, ale także działania finansowane są z różnych środków zewnętrznych. Jest to dobry punkt wyjścia do stwierdzenia, że rewitalizacja w Gminie Dębica nie jest tylko „pojedynczym epizodem” związanym z możliwością pozyskania środków na ten cel, ale jest kompleksowym procesem, prowadzonym zgodnie z planem i przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych i możliwych do pozyskania środków finansowych i zasobów rzeczowych.

Spis tabel

Tabela 1 Wskaźniki monitoringowe wdrażania programu.....	7
Tabela 2 Wskaźniki oddziaływania w poszczególnych latach obowiązywania programu (wg stanu na dzień 31.12).....	12
Tabela 3 Wskaźniki produktu i rezultatu w odniesieniu do poszczególnych projektów podstawowych.....	22
Tabela 4 Wskaźniki produktu i rezultatu – wartości osiągnięte łącznie wg stanu na 31.12.2019 r.....	24
Tabela 5 Analiza wykonania finansowego projektów podstawowych ujętych w GPR.....	27
Tabela 6 Analiza wykonania finansowego przedsięwzięć uzupełniających ujętych w GPR...	32

Spis wykresów

Wykres 1 Udział % ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do ludności ogółem.....	13
Wykres 2 Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	14
Wykres 3 Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	15
Wykres 4 Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania	15
Wykres 5 Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	16
Wykres 6 Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania.....	17
Wykres 7 Frekwencja w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (I tura).....	17
Wykres 8 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	18
Wykres 9 Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania	18
Wykres 10 Powierzchnia (w ha) terenów zagospodarowanych pod działalność sportową, rekreacyjną, kulturową i turystyczną przypadająca na 100 mieszkańców	19

Wykres 11 Budynki mieszkalne nowo oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców	20
Wykres 12 Udział % źródeł finansowania rozpoczętych i zrealizowanych podstawowych projektów rewitalizacyjnych	30
Wykres 13 Porównanie szacowanej wartości w GPR i rzeczywistej wartości projektów podstawowych po realizacji (w złotych)	31
Wykres 14 Udział % źródeł finansowania zrealizowanych przedsięwzięć uzupełniających ..	36
